


MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
**ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS**


Contrato No. MCQ.SOP.FAFEF.AD.001.27/2022-00817

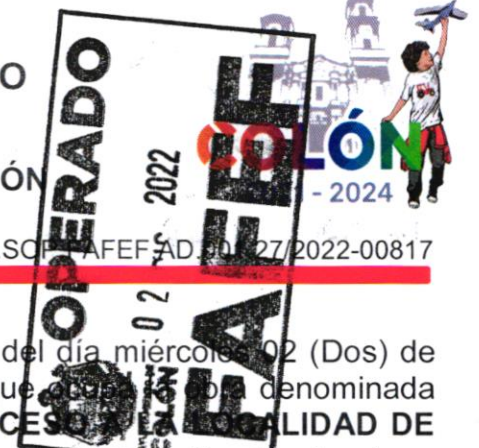

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 (Once) horas del día miércoles 02 (Dos) de noviembre del 2022 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que se denominada **REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE URECHO**. Por parte del Municipio de Colón, el **Arq. Fidel López Becerra**, director de obras públicas; el **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, jefe del departamento de supervisión de obras públicas; el **Ing. Emmanuel Ruiz Ramírez**, Supervisor de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., y en representación de "EL CONTRATISTA", el **Ing. Gerardo Vega Bernal**, para realizar en cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la ley aplicable, y en seguimiento al escrito del martes 01 (Uno) de noviembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) y recibido por parte del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el mismo día, en el que "EL CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el día martes 01 (Uno) de noviembre del 2022 (Dos Mil Veintidós), el Acto de **Verificación de Terminación de los Trabajos** ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública Número **MCQ.SOP.FAFEF.AD.001.27/2022-00817**.

Las metas alcanzadas son las siguientes:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA				
PREELIMINARES				
1010001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, ÁREA VISUAL DE 1.22 X 2.44 M DOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE 3" X 3" CAL. 11, FORMADO POR DOS POSTES DE 4.24 M MÁS 0.70 M EMPOTRADOS EN DADOS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, TRES TRAVESAÑOS DE 1.22 M Y LÁMINA NEGRA CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRAnte FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	pza	1.00	1.00
1021002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO EN OBRA DE URBANIZACIÓN, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	1416.52	496.04
1051002	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA DE 3 A 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON PERFILADORA. INCLUYE: MARCAJE DE LÍNEA, GUIA SOBRE PAVIMENTO, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE EL FRESADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	1416.52	1418.38
CARGAS Y ACARREOS				
2030084	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO KILÓMETROS SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3-km	570.78	672.29
PAVIMENTOS				
8060002	BARRIDO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BARREDORA MÉCANICA Y TERMINACIÓN A BASE DE SOPLETEADO CON COMPRESOR, DEJANDO LA SUPERFICIE LIMPIA Y EXENTA DE POLVO PARA APLICAR EL TENDIDO DE PAVIMENTO, INCLUYE: EQUIPO, CARGA, RETIRO DE MATERIAL EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	1416.52	1418.38

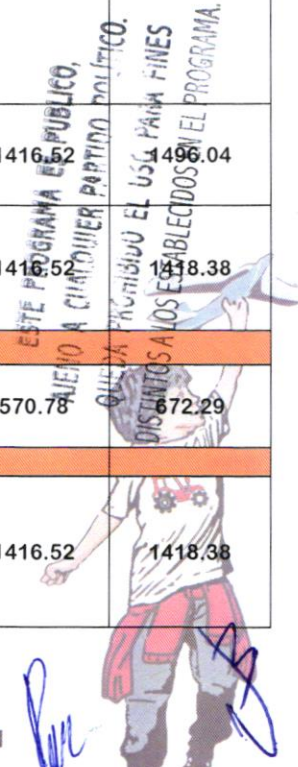

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
**ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS**



Contrato No. MCQ.SOP.FAFEE/001.27/2022

8060352	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN TIPO ECR-60 APLICADA CON PETROLIZADORA A RAZÓN DE 0.7 LITROS/M2. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, BOMBEO Y APLICACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	6.52	6.52
8060510	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR (MEDIDO COMPACTO), DE MEZCLA EN CALIENTE, ELABORADA CON AGREGADOS PÉTREOS DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFÁLTICO EKBÉ SUPERPAVE PG 64-22, INCLUYE: TENDIDO CON MÁQUINA EXTENDEDORA, COMPACTACIÓN AL 95% DE SU P. V. M. DEFINIDO EN EL DISEÑO MARSHALL, SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACIÓN, ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIOS DE MATERIALES, TENDIDO, COMPACTADO, RECORTES DE LA CARPETA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m2		
CO-LIMP.	LIMPIEZA			
1020501	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	1416.52	1418.38


PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el jueves 15 de septiembre de 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el miércoles 23 de noviembre de 2022 (Dos Mil Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del jueves 15 de septiembre de 2022 (Dos Mil Veintidós) al martes 01 de noviembre de 2022 (Dos Mil Veintidós).

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

A la fecha se tiene una estimación tramitada, y se instruye a "EL CONTRATISTA" para realizar la estimación finiquito correspondiente.

"EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y "LA CONTRATANTE" recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la volumetría cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o pérdida de las características originalmente contratadas de manera prematura por razones ambientales y climatológicas no detectadas al momento de la verificación.




MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
**ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS**

Contrato No. MCQ.SOP.FAFEF.AD.001.27/2021.00817



Una vez concluida la verificación de los trabajos, “**EL CONTRATISTA**” contará con un plazo de 5 días naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento de la **Acta de Entrega-Recepción** correspondiente quedando mientras tanto los trabajos bajo la responsabilidad de **EL CONTRATISTA**”.

Terminados físicamente los trabajos, “**LAS PARTES**” dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir de la recepción de las mismas, se deberá elaborar el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas.

Se cierra la presente a las 13:30 hrs. del mismo día y año del inicio de ésta acta, integrándose original a la estimación finiquito junto con el **Acta de Entrega-Recepción** de obra y original para **EL CONTRATISTA**”.

Firman de conformidad los que en esta intervinieron.

POR “LA CONTRATANTE”

Ing. Emmanuel Ruiz Ramírez
Supervisor de Obras Públicas del Municipio de
Colón, Qro.

POR “LA CONTRATISTA”

Ing. Gerardo Vega Bernal
CONTRATISTA

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR EL PARTIDO POLÍTICO AL QUE PERTENEZCAN SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CAMPAÑAS POLÍTICAS ELECTORALES, DE ELECTO Y QUE SE DIRIGAN A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDIVIDUAL EN ESTOS CURSOS EN ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y CARICIADO DE ACUERDO CON LA LEY QUE ESTABLECE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.


ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
**ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS**

Contrato No. MCQ.SOP.FAFEF.AD.001.27/2022-00817

POR "LA CONTRATANTE"




Ing. Cirilo Ramírez Cabrera
Jefe del Departamento de Supervisión de
Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.

POR "LA CONTRATANTE"



Arq. Fidel López Becerril
Director de Obras Públicas del Municipio de
Colón, Qro.



ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y FUE FINANCIADO
EL PROPÓSITO POR PARTIDO POLÍTICO / APLICAR Y
REGLAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN LOS
LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE
PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES DE LUCHA
CONTRA DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA
DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACORDO CON LA LEY
APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.



Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" referente a la obra denominada **REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE URECHO**. En Colón, Qro. De fecha miércoles 02 (Dos) de noviembre del 2022 (Dos mil Veintidós).
