



**OPERADO
FISM
2022**

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
**ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
 DE LOS TRABAJOS**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO DE ESTOS
 DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY



Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.003.01.2022

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (Díez) horas del día martes 06 (seis) de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO, COLON, QRO.** Por parte del Municipio de Colón, el **Arq. Fidel López Becerril**, Director de Obras Públicas; el **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, jefe del departamento de supervisión de obras públicas; el **Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz**, Supervisor de Obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., y en representación de "EL CONTRATISTA", **DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ**, para realizar en cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la ley aplicable, y en seguimiento al escrito del lunes 05 (cinco) de septiembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) y recibido por parte del Departamento de Supervisión del Municipio de Colón el mismo día, en el que "EL CONTRATISTA" comunicó a la Entidad la conclusión de los trabajos el día sábado 03 (tres) de septiembre del 2022 (Dos Mil Veintidós), el Acto de **Verificación de Terminación de los Trabajos** ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública Número **MCQ.SOP.FISM.AD.003.01.2022.**

Las metas alcanzadas son las siguientes:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA
A	URBANIZACION			
CO-PRE	PREEELIMINARES			
1010001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, ÁREA VISUAL DE 1.22 X 2.44 M DOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE 3" X 3" CAL. 11, FORMADO POR DOS POSTES DE 4.24 M MÁS 0.70 M EMPOTRADOS EN DADOS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, TRES TRAVESAÑOS DE 1.22 M Y LÁMINA NEGRA CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	pza	1.00	1.00
01021002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO EN OBRA DE URBANIZACIÓN, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	1,064.00	1637.82
CO-EXC	EXCAVACIONES			
2020102	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y PAREDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	m3	246.85	363.18
2020103	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2. 00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y PAREDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	m3	370.27	76.99
02030017	CARGA A MÁQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ACARREO AL 1ER KM EN CAMIÓN DE VOLTEO TAPADO CON LONA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: PAGO DE DERECHO DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.(TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS).	m3	617.12	465.75
2030082	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO), INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3-km	6,232.91	512.33



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO
POR PARTIDO POLÍTICO AFILIADO Y SUS
EN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS
ES ESTA PROHIBIDO EL
ES PARTICIPAR, DE ALIENAR
A LOS ESTABLECIMIENTOS, QUE HA
DE LOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, DEBERA SI
CONVINO A LA AUTORIDAD COMPETENTE.

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS


**OPERANDO
FISMA
2022**




Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.003.01.2022

QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

III	REPARACIÓN Y RENIVELACIÓN			
01080252	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CM DE DIFERENCIA. INCLUYE: DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ACARREOS, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	pza	2.00	0.00
1080123	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 10.00 M DE LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEK DE 1/2" (13 MM), EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA DE MATERIAL INERTE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, APISONADO DEL RELLENO, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	6.00	4.00
1080001	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 5.00 M DE LONGITUD PROMEDIO CON TUBERÍA DE PVC SERIE 16.5 DE 6" (15 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA DAÑADA, PLANTILLA DE TEPETATE, DOS CODOS UNO DE 6"X45° Y OTRO DE 6"X90°, MATERIALES, CORTES, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	pza	4.00	0.00
IV	TERRACERÍAS			
8010151	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P. V. S. M. CON RODILLO VIBRATORIO Y HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,064.00	1061.35
8010502	SUB RASANTE FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, PUESTO EN OBRA, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. DE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA CON RODILLO LISO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	425.60	0.00
V	GUARNICIONES Y DENTELLONES			
8040002	DENTELLÓN DE 15X30 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VARILLADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	366.00	35.75
VI	PAVIMENTOS			
08060152	PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 18 CM DE ESPESOR, CON PIEDRA PARA EMPEDRAR, ASENTADA SOBRE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MAYOR A 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, EN FRANJAS HASTA 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, SELECCIÓN DE LA PIEDRA, DESPERDICIO, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1,064.00	1224.76
VII	LIMPIEZAS			
1020501	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	1,064.00	1637.82
VIII	CONCEPTO FUERA DE CATALOGO			
ATP01	SUB RASANTE FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, PUESTO EN OBRA, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. DE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA CON RODILLO LISO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	256.02
ATP 02	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION CONCRETO F'C=200KG/CM2 ELABORADO CON REVOLVEDORA AGREGADO MAXIMO DE 3/4 INC: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETOVARILLADO, CURADO CON MEMBRANA, JUNTAS DE CELOTEX PARA JUNTAS FRIAS A C/3MT, PRUEBA DE LABORATORIO EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	0.00	342.54
ATP03	Toma de alimentación de agua potable con manguera kitec de 1/2" (13mm) de diámetro de hasta 8.00 m de longitud promedio. Incluye: abrazadera de PVC roscada de salida de 2"x1/2" con tornillos de acero inoxidable, conectores, llave de inserción de bronce de 1/2", codo combinado, tubo de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro por 60 cm de longitud con rosca exterior y tapón de foga de 1/2"; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	PZA	0.00	6.00

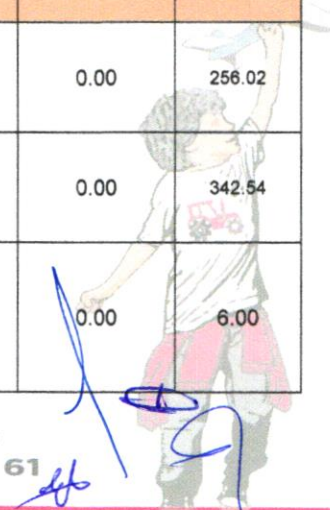



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN

2021-2024

ESTE PROGRAMA ES F...
AIENO A CUALQUIER PARTIDO,
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA,
DISTINTOS A LOS DEL EQUIPO...

MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS



Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.003.01.2022

ATP04	Toma de alimentación de agua potable con manguera kitec de 1/2" (13mm) de diámetro de hasta 2.00 m de longitud promedio. Incluye: abrazadera de PVC roscada de salida de 2"x1/2" con tornillos de acero inoxidable, conectores, llave de inserción de bronce de 1/2", codo combinado, tubo de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro por 60 cm de longitud con rosca exterior y tapón de foga de 1/2"; materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	PZA	0.00	4.00
ATP05	Descarga domiciliaria con tubería de pvc sanitario serie 16.5 de 6" (150mm) de diámetro, de una longitud promedio de 5.00 m. Incluye: suministro, acarreo, colocación y desperdicios de los materiales, junteado; codo, Silleta de pvc serie 16.5 inyectado 12"x6", pruebas, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. No incluye excavaciones ni rellenos.		0.00	8.00
ATP06	REGISTRO DE 40 X 60 CM. Y 0.90 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABICÓN 10 X 14 28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE PROP 1:3 FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR CON ELABORACION DE MEDIA CAÑA, APLANADO TERMINADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-CAL-ARE EN PROP. 1:2:6 INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1", TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ARMADA CON VAR. NO 3 @ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENO		0.00	9.00
ATP07	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA EN MATERIL TIPO "B" PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE AFINE DE FONDO Y PAREDES MAQUINARIA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA COMPLETA Y COMPLETA EJECUCION		0.00	15.34
ATP08	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA EN MATERIL TIPO "C" PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE AFINE DE FONDO Y PAREDES MAQUINARIA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA COMPLETA Y COMPLETA EJECUCION		0.00	10.25
ATP09	Reparación de red de agua potable de 2" de diámetro de PVC averiadas durante el proceso de excavaciones de longitud promedio de 3.00 m. Incluye: retiro de tubo existente, sustitución de tubería de pvc RD-26, coples, empaques, excavaciones, relleno con material producto de excavación, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.		0.00	3.00
ATP10	Demolición con equipo ligero de elementos de concreto simple (banquetas, pisos, rampas y guarniciones) según valoración de la supervisión. Incluye: limpieza, acarreos en carretilla dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		0.00	0.96
ATP11	Renivelación de registro de tabicón de 40 x 60 cm, hasta 30 cm de diferencia. Incluye: demolición, recuperación de tapa con marco y contramarco, reconstrucción de muro de tabicón común asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, terminado pulido con mortero cemento-arena proporción 1:3, colocación y nivelación de contramarco y tapa, acarreos, limpieza, carga y acarreo en camión de volteo de material de desperdicio fuera de la obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.		0.00	6.00
ATP12	Relleno en banquetas con material inerte de banco compactado con equipo menor (placa vibratoria o bailarina) al 90% de su P. V. S. M. de la compactación proctor modificada, espesor de capas indicado por la supervisión. Incluye: suministro, acarreo de los materiales, agua, tendido, compactado, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. P.U.O.T.		0.00	38.90
ATP13	Banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, hecho con revolvedora, T. M. A. 3/4", terminado escobillado y volteador, juntas de construcción @ 2.5m. Incluye: suministro, colocación, acarreo de los materiales, cimbra, cimbrado, descimbrado, curado con agua, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.		0.00	180.73
ATP15	Tope trapezoidal de 1.60 m de base, 0.80 m de corona y peralte de 15 cm, a base de piedra bola, asentada y juntada con mortero cemento arena en proporción 1:3 y núcleo de tepetate compactado al 95%. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta para su completa ejecución. P.U.O.T.		0.00	20.94
ATP16	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CM DE DIFERENCIA. INCLUYE: DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, RECUPERACIÓN, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ACARREOS, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.		0.00	3.00

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 06 de junio del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el sábado 03 de septiembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del lunes 25 de junio del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al sábado 03 (tres) de septiembre del 2022 (Dos Mil Veintidós).

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

A la fecha se tienen 2 (dos) estimaciones tramitadas, y se instruye a **"EL CONTRATISTA"** para realizar la estimación 3 finiquito correspondiente.

"EL CONTRATISTA" entrega los trabajos de acuerdo a las cláusulas contractuales y **"LA CONTRATANTE"** recibe como concluidos los trabajos ejecutados, reservándose el derecho de aplicar las sanciones contempladas en las cláusulas del contrato las leyes mismas y sus reglamentos en la materia por trabajos mal ejecutados, deficiencias en la calidad de los mismos, diferencia en la volumetría cobrada y demás, así como la presencia de vicios ocultos derivados de un uso normal y/o pérdida de las características originalmente contratadas de manera prematura por razones ambientales y climatológicas no detectadas al momento de la verificación.


Una vez concluida la verificación de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo de 15 días naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento de **Acta de Entrega-Recepción** correspondiente quedando mientras tanto los trabajos bajo la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"**.

Terminados físicamente los trabajos, **"LAS PARTES"** dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 15 días naturales a partir de la recepción de las mismas, deberán elaborar el finiquito en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de los trabajos en la presente Acta revisadas y verificadas.

Se cierra la presente a las 11:30 hrs. del mismo día y año del inicio de ésta acta, integrándose original a la estimación finiquito junto con el **Acta de Entrega-Recepción** de obra y original para **"EL CONTRATISTA"**.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR EL PARTIDO POLÍTICO ALCIADO Y SUS RECURSOS SON DE ORIGEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS COLONENSES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA POR PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUCIONES DE LUJUR Y DE CARÁCTER PORNÓGRAFO, O LOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAYAN SIDO CANCELADOS POR LOS PROCESOS DE ESTE PROGRAMA. DEBE SER DE CARÁCTER PÚBLICO Y FINANCIADO DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

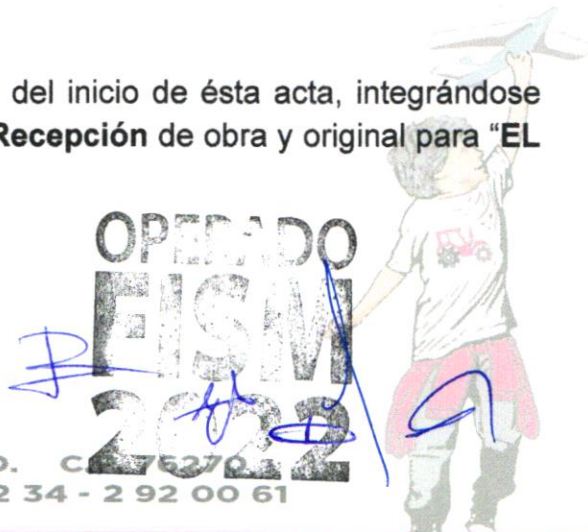


MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
**ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN
DE LOS TRABAJOS**

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.003.01.2022

Firman de conformidad los que en esta intervinieron.

POR "LA CONTRATANTE"



Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz
Supervisor de Obras Públicas del Municipio de
Colón, Qro.

POR "LA CONTRATISTA"



DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ
CONTRATISTA

POR "LA CONTRATANTE"



Ing. Cirilo Ramírez Cabrera
Jefe del Departamento de Supervisión de
Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.

POR "LA CONTRATANTE"



Arq. Fidel López Becerril
Director de Obras Públicas del Municipio
de Colón, Qro.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO
NI FINANCIADO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS
RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS
LOS CIUDADANOS ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE
PROGRAMA PARA FINES POLÍTICOS, DISTINTOS AL LÍCIRO Y
OTROS DISTINGUOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBEN SER
DETERMINADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY
APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" referente a la obra denominada URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO, COLÓN, QRO. De fecha martes 06 (seis) de septiembre del 2022 (Dos mil Veintidós).

**OPERADO
FISM
2022**

